

ポ－ラー設置記録

[赤水対策]

ユーザー名 : 名古屋市Mセンチュリーマンション(築後 27 年、271 世帯)


目的 : 赤水対策(60t 受水槽 × 2 槽 + 30t 高架水槽 × 1 槽)

設置日 : 平成 13 年 1 月 25 日

ポ－ラー型式 : PI-65 型 × 2 台を独立循環方式にて各 60t 受水槽に設置)

説明 : 築後 27 年が経過し赤水が蛇口より出るようになったので、理事会にて各工法を 1 年間検討してポ－ラーが採用された。水は管理人室の隣の部屋より採水して分析したが設置 1 週間位で赤水が止ってしまった。
効果の早さに皆さんがビックリしていました。

ポ－ラー ポンプシステム (P.P.S)
制御盤(電源パネル)

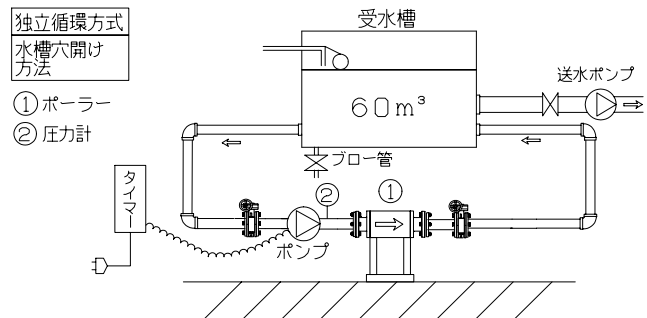

ポ－ラー型式 PI - 65 × 2 台を循環ポンプと配管してポ－ラーポンプシステム(P.P.S)として設置しました。

(平成 13 年 1 月 25 日)



分析項目	設置前	1ヶ月後	2ヶ月後
pH	7.1	7.0	6.9
鉄分 (mg/L)	0.4	0.19	0.05
濁度 (度)	2	1 未満	1 未満
色度 (度)	2	1	1
残留塩素 (mg/L)	0.1	0.3	0.4
